


末吉橋ニュース 第6号

2021年（令和3年）12月上旬 車道を仮橋へ切り替えます！

本工事は2029年（令和11年）の完成を目標に事業を進めています。
この度、既設橋の撤去や新しい橋の構築のため、2027年（令和9年）頃まで仮橋へ車道を切り替えます。

～工事の進捗状況について～

8月から、横浜市側にて新橋の橋台杭の一部（10本）を打設する工事を実施し、9月下旬に完了しました。
現在、12月上旬の交通切替に向けて、工事（仮橋舗装工、道路改良工、付帯設備整備等）を進めています。

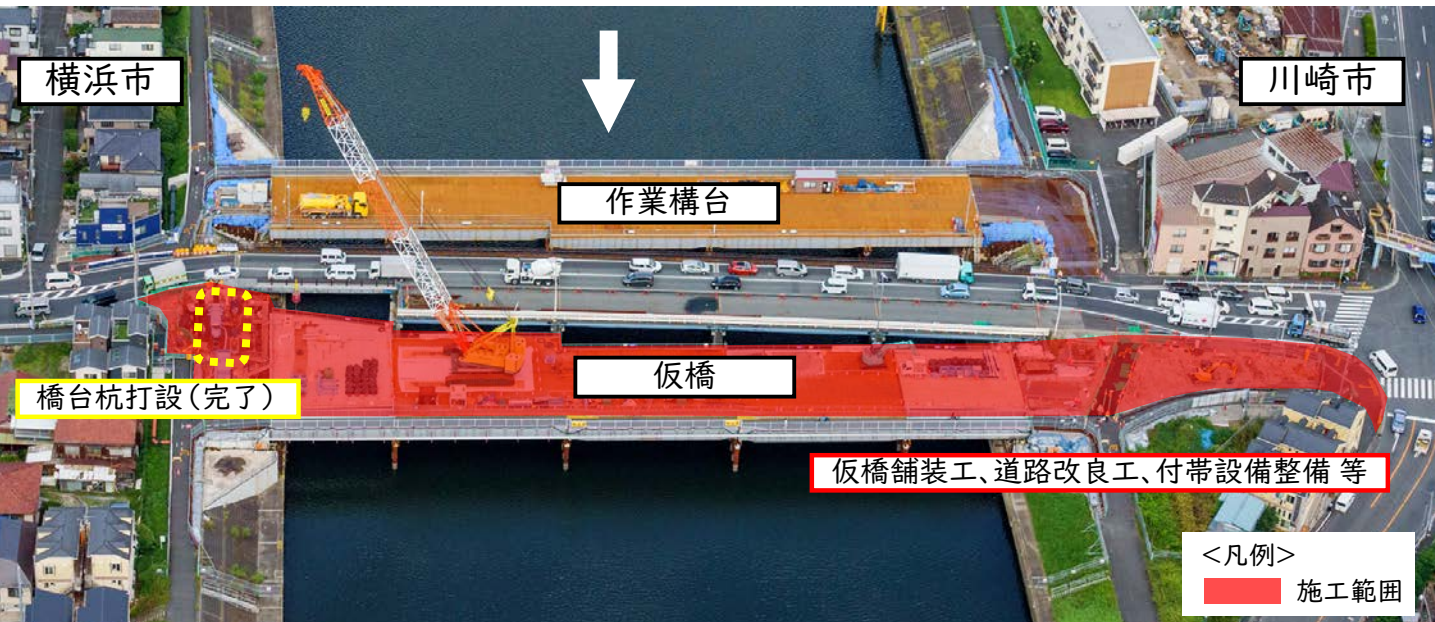

橋台杭打設工事（横浜市側）

杭径800mm、全長約40mの杭を10本打設しました。

道路改良工事（川崎市側）

仮橋へ接続する道路の整備を行っています。




～歩道・車道の通行状況～

車道は、引き続き対面通行となりますが、**末吉橋交差点(川崎市側)の交差点形状が変わります**ので、ご注意ください。歩道はこれまでと同様ですが、自転車の方は、事故防止のため、自転車から下りて歩道をご通行ください。ご通行の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、引き続き、ご理解・ご協力をお願いします。

【車道切替後】

今回の切り替えて県内最後の「角形信号機」が最新のものに入れ変わります。

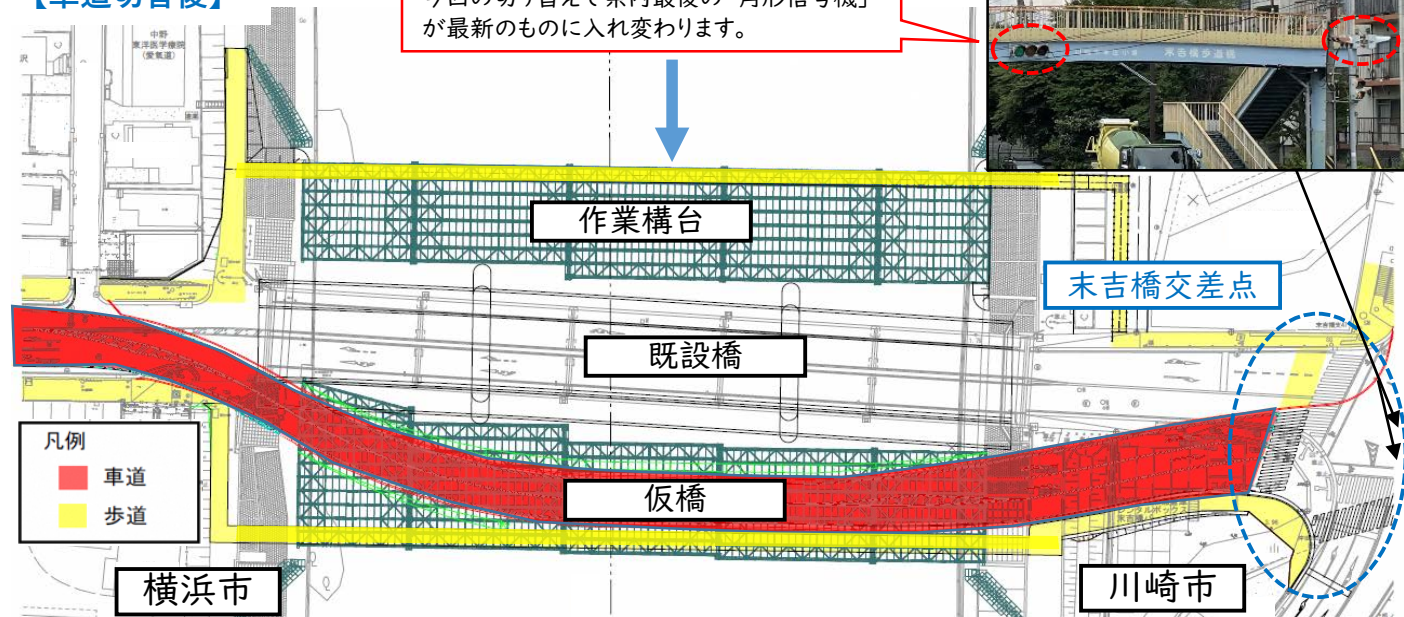


～今後の工事予定～

交通切替後は、既設橋上部工の撤去工事や新しい橋の橋台施工を行います。


主な工種	2021年(令和3年)		2022年(令和4年)									
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
仮橋舗装工	■											
道路改良工	■											
既設橋撤去工		■	■	■								
仮設工					■	■	■	■	■	■	■	■
橋台工								■	■	■	■	■

既設橋上部工撤去

交通切替により、車両通行が無くなった既設橋の撤去工事を行います。一部については、先行的に撤去しており、今回も同様の方法で撤去します。(写真:先行撤去時)

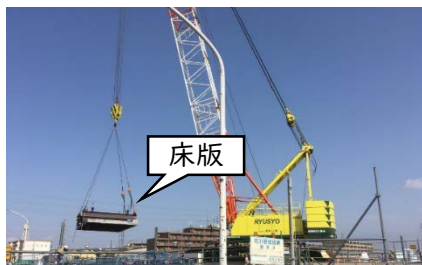

正面図(イメージ)

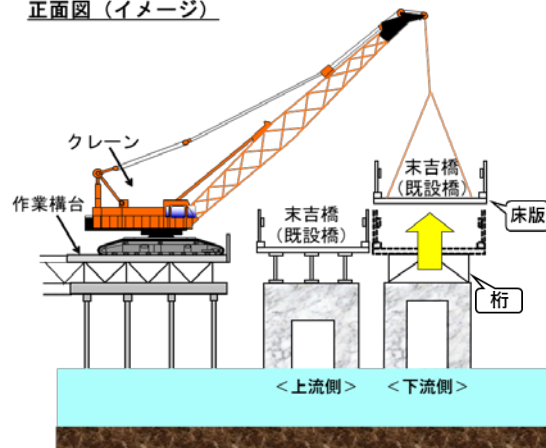

撤去する部分を切断し、床板(コンクリートの床)と鋼鉄製の桁を分離します。分離した床板と桁は、仮橋からクレーンで大きい塊の状態ですり上げ、一旦、作業構台上に仮置きします。その後、トラックで運搬できる大きさに再度切断し、現場から搬出します。

～お問い合わせ～

●横浜市道路局橋梁課
住所:横浜市中区本町6丁目50番地の10
TEL:045-671-2796
FAX:045-662-3945

●大成・東洋建設共同企業体 末吉橋架替工事作業所
住所:横浜市鶴見区上末吉4-7-12
TEL:045-717-8711
FAX:045-717-8712

事業に関する情報を横浜市道路局のホームページに掲載していますので、あわせてご確認ください。

末吉橋 架替
