

特定事業の進捗状況

1 特定事業の進捗状況調査について

バリアフリー法 25 条の 2 では、「市町村は、基本構想を作成した場合においては、おおむね 5 年ごとに、当該基本構想において定められた重点整備地区における特定事業その他の事業の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努める」とされています。

横浜市では特定事業の進捗状況を把握するため、毎年調査を行っており、令和 4 年度末（令和 5 年 3 月時点）の進捗状況について調査をしました。

※ 令和 4 年度には、磯子区、中区、踊場駅周辺地区、羽沢横浜国大駅周辺地区を策定しました。関内駅周辺地区および杉田駅・新杉田駅周辺地区はそれぞれ、中区、磯子区のバリアフリー基本構想の策定にあたり、見直しのうえ内包しています。

2 進捗状況調査の結果（令和 4 年度末時点） ※表-1、表-2 参照

(1) 全体の結果

横浜市は、特定事業の整備目標年次を、基本構想策定からおおむね 5 年後としています。

整備目標年度を経過した鶴見駅周辺地区から十日市場駅周辺地区までの計 14 地区の特定事業の進捗率は約 85%、整備目標年度に達していない地区も含めた全 20 地区の進捗率は約 63%となりました。

(2) 前回との比較

整備目標年度を経過して 1～2 年の市が尾駅周辺地区及び十日市場駅周辺地区では、昨年度に引き続き、道路特定事業で進捗率が増加しました。前回調査と比べ、市が尾駅周辺地区では 8 件完了し 20%増加、十日市場駅では 4 件完了し 13%増加しました。

(3) 未完了事業について

未完了事業で進捗が進まない主な理由として、予算の確保に関するものが多く見受けられるほか、エレベーターの改修や、通路の有効幅員の確保など、大規模なものや外部の影響を受ける事業は、他事業と比較して早期の対応が難しいことが挙げられています。一方、階段の段鼻の明示、視覚障害者誘導用ブロックの改修などは早期に取り組まれていることから、工事費が比較的安価な事業や、事業者が単独で実施できる事業は、完了となっている傾向にあります。

表-1 各地区の特定事業の進捗状況

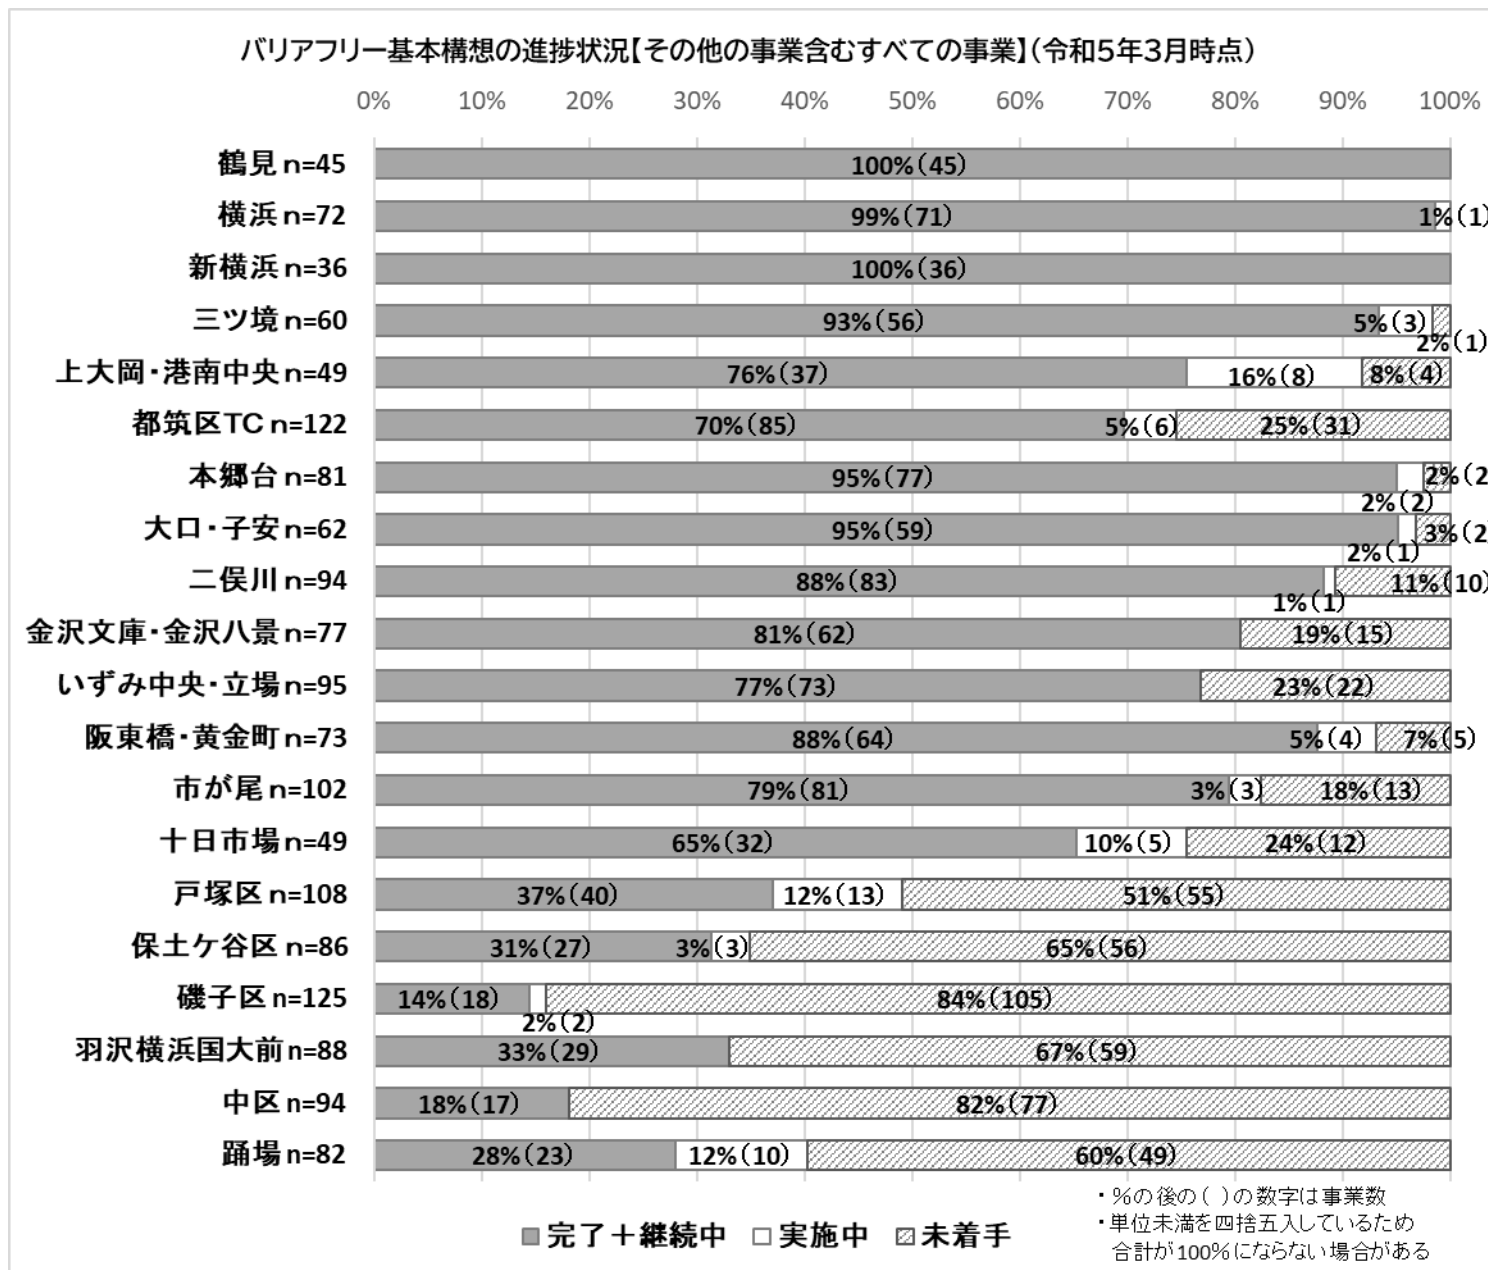


表-2 各地区の特定事業の進捗状況（事業別）

事業	地区	作成後5年以上の地区														作成後5年以内の地区						作成後5年以上の14地区合計	作成後5年以内の6地区合計	20地区合計
		鶴見	横浜	新横浜	三ツ境	上大岡・港南中央	都筑区TC	本郷台	大口・子安	二俣川	金沢文庫 金沢八景	いずみ中央・立場	阪東橋・黄金町	市が尾	十日市場	戸塚区	保土ヶ谷区	磯子区	羽沢横浜国大前 神奈川区保土ヶ谷区	中区	踊場			
		鶴見区	西区	港北区	瀬谷区	港南区	都筑区	栄区	神奈川区	旭区	金沢区	泉区	南区	青葉区	緑区	戸塚区	保土ヶ谷区	磯子区	神奈川区保土ヶ谷区	中区	戸塚区泉区			
作成	H16.8	H18.8	H18.8	H19.3	H20.5	H22.5	H23.8	H23.12	H24.5	H25.3	H25.3	H27.3	H28.3	H29.3	H30.11	H31.3	R4.4	R4.5	R4.6	R4.7				
整備目標	H22	H22	H22	H22	H22	H26	H28	H28	H29	H29	H29	H31	R2	R3	R5	R6	R9	R9	R9	R9				
公共交通	事業数	14	29	15	21	29	19	6	8	14	3	34	15	11	2	20	9	19	0	4	24	220	76	296
	完了+継続中◎	14	28	15	17	19	16	3	8	12	3	30	13	10	2	14	4	5	0	0	4	190	27	217
	実施中○	0	1	0	3	8	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	15	2	17
	未着手△	0	0	0	1	2	2	1	0	2	0	4	2	1	0	5	4	14	0	4	20	15	47	62
	未回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	進捗率	100%	97%	100%	81%	66%	84%	50%	100%	86%	100%	88%	87%	91%	100%	70%	44%	26%	—	0%	17%	86%	36%	73%
道路	事業数	19	29	15	32	16	53	32	39	34	35	35	41	57	30	58	35	48	27	28	20	467	216	683
	完了+継続中◎	19	29	15	32	14	27	32	37	29	27	18	36	42	13	9	3	1	0	0	3	370	16	386
	実施中○	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	2	0	5	9	0	0	0	0	0	11	9	20
	未着手△	0	0	0	0	2	23	0	1	5	8	17	3	15	12	40	32	47	27	28	17	86	191	277
	未回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	進捗率	100%	100%	100%	100%	88%	51%	100%	95%	85%	77%	51%	88%	74%	43%	16%	9%	2%	0%	0%	15%	79%	7%	57%
交通安全	事業数	1	1	1	1	1	7	4	1	1	1	6	7	8	3	7	2	12	5	8	9	43	43	86
	完了+継続中◎	1	1	1	1	1	7	4	1	0	1	6	6	7	3	4	1	3	5	4	2	40	19	59
	実施中○	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	5	3	7	10
	未着手△	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	0	4	2	0	17	17
	未回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	進捗率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	86%	88%	100%	57%	50%	25%	100%	50%	22%	93%	44%	69%
都市公園	事業数						18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	6	19	14	33
	完了+継続中◎						15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	16	5	21
	実施中○						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4
	未着手△						3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	5	8
	未回答						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	進捗率						83%	—	100%	—	—	—	—	—	—	—	100%	—	—	25%	0%	84%	36%	64%
建築物	事業数						22	34	10	35	22	20	3	16	9	17	36	42	54	43	20	171	212	383
	完了+継続中◎						17	33	9	32	15	19	2	13	9	12	15	5	22	5	11	149	70	219
	実施中○						2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4	3	7
	未着手△						3	1	1	3	7	1	0	2	0	5	20	36	32	38	8	18	139	157
	未回答						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	進捗率						77%	97%	90%	91%	68%	95%	67%	81%	100%	71%	42%	12%	41%	12%	55%	87%	33%	57%
教育啓発	事業数																	4	2	6	3	0	15	15
	完了+継続中◎																	4	2	6	3	0	15	15
	実施中○																	0	0	0	0	0	0	0
	未着手△																	0	0	0	0	0	0	0
	未回答																	0	0	0	0	0	0	0
	進捗率																	100%	100%	100%	100%	—	100%	100%
その他	事業数	11	13	5	6	3	3	5	3	10	16	0	7	10	5	6	0	0	0	1	0	97	7	104
	完了+継続中◎	11	13	5	6	3	3	5	3	10	16	0	7	9	5	1	0	0	0	1	0	96	2	98
	実施中○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	3	4
	未着手△	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2
	未回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	進捗率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—	100%	90%	100%	17%	—	—	—	100%	—	99%	29%	94%
全体	事業数	45	72	36	60	49	122	81	62	94	77	95	73	102	49	108	86	125	88	94	82	1017	583	1600
	完了+継続中◎	45	71	36	56	37	85	77	59	83	62	73	64	81	32	40	27	18	29	17	23	861	154	1015
	実施中○	0	1	0	3	8	6	2	1	1	0	0	4	3	5	13	3	2	0	0	10	34	28	62
	未着手△	0	0	0	1	4	31	2	2	10	15	22	5	18	12	55	56	105	59	77	49	122	401	523
	未回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	進捗率	100%	99%	100%	93%	76%	70%	95%	95%	88%	81%	77%	88%	79%	65%	37%	31%	14%	33%	18%	28%	85%	26%	63%

凡例
 : 100%
 : ~90%
 : ~80%
